

日置市 橋梁長寿命化修繕計画 【平成30年度版】 (令和7年5月改定)

古城大橋（2004年竣工）



荻前田橋（1931年竣工）

橋梁長寿命化計画とは・・・

今後、老朽化する道路橋が増大する中、市民の安心・安全を確保しつつ、計画的な維持管理を実施し、橋梁の長寿命化を図るとともに、予算の平準化、維持管理のコスト縮減を図ることで、将来的な財政への負担軽減を目的として長寿命化修繕計画を策定します。

目 次

- 1 日置市の概要
- 2 長寿命化修繕計画の目的の設定
- 3 対象施設について
- 4 計画期間について
- 5 対策の優先順位の考え方
- 6 個別施設の状態等
- 7 維持管理に対する基本方針
- 8 対策内容と実施の時期について
- 9 対策費用と計画による効果
- 10 学習経験者による意見の聴取
- 11 集約・撤去、新技術の活用方針について

これまでの経緯について

- ★平成23年度 長寿命化修繕計画の策定
- ★平成24年度 長寿命化修繕計画の見直し
- ★平成30年度 長寿命化修繕計画の見直し
- ★令和 4年度 長寿命化修繕計画の見直し ←本計画書

1. 日置市の概要

(1) 日置市について

日置市は、平成17年5月1日に、東市来町、伊集院町、日吉町、吹上町が合併し、『日置市』が誕生しました。日置市は、県の西部、薩摩半島のほぼ中央に位置し、北はいちき串木野市及び薩摩川内市、東は鹿児島市、南は南さつま市に隣接し、西は日本三大砂丘の一つ、白砂青松の吹上浜と東シナ海に面している。交通のアクセスは、鹿児島市より、南九州西回り自動車道で概ね10分、JR九州 伊集院駅まで概ね17分の時間距離です。



面積：253.01km²
(H27.10.1現在)

▲日置市概要図



▲市花 うめ



▲市木 クロマツ

日置市の統計データ


人口 (2017.10.1現在)	49,386人	第1次産業 就業人口率	7.5%
男性	23,349人	第2次産業 就業人口率	25.2%
女性	26,037人	第3次産業 就業人口率	67.3%
65歳以上人口	16,146人	面積	253.01km ² (県内第15位)
高齢化率	32.4%	宅地	1,520ha (6.0%)
15歳未満人口	6,419人	農地 (田・畑)	4,566ha (18%)
年少率	13.0%	森林 (山林・原野)	13,076ha (51.7%)
世帯数	22,714世帯	その他	6,139ha (24.3%)
議員定数	22人		

2. 長寿命化修繕計画の目的の設定


(1) 橋梁の整備状況

日置市が管理する道路橋は、**309橋**です。地域別では吹上地域（103橋：33%）が最も多く、続いて東市来地域（94橋：31%）、伊集院地域（75橋：24%）、日吉地域（37橋：12%）です。


地域別の割合

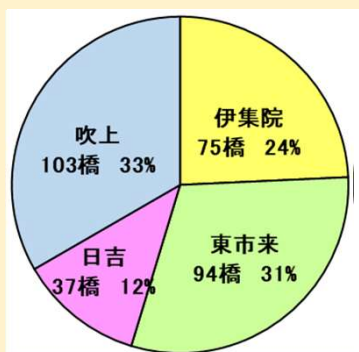

▲全橋（309橋）

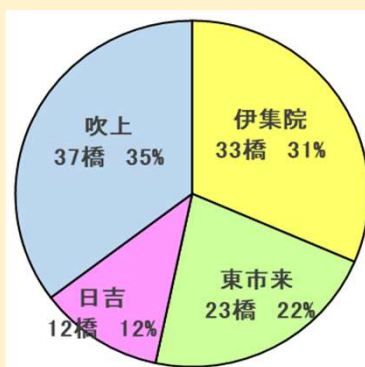


▲橋長15m以上
（105/259橋）

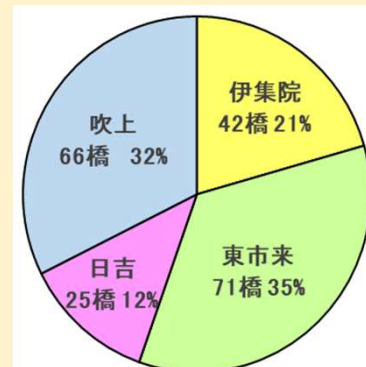

▲橋長15m未満
（204/259橋）

(2) 日置市が管理する橋梁の現状

日置市の管理する橋梁309橋のうち、50年を経過している橋梁は全体の104橋（39%）です。しかし、10年後には138橋（52%）、20年後には171橋（65%）に達し、老朽化が急速に進行することが懸念されます。

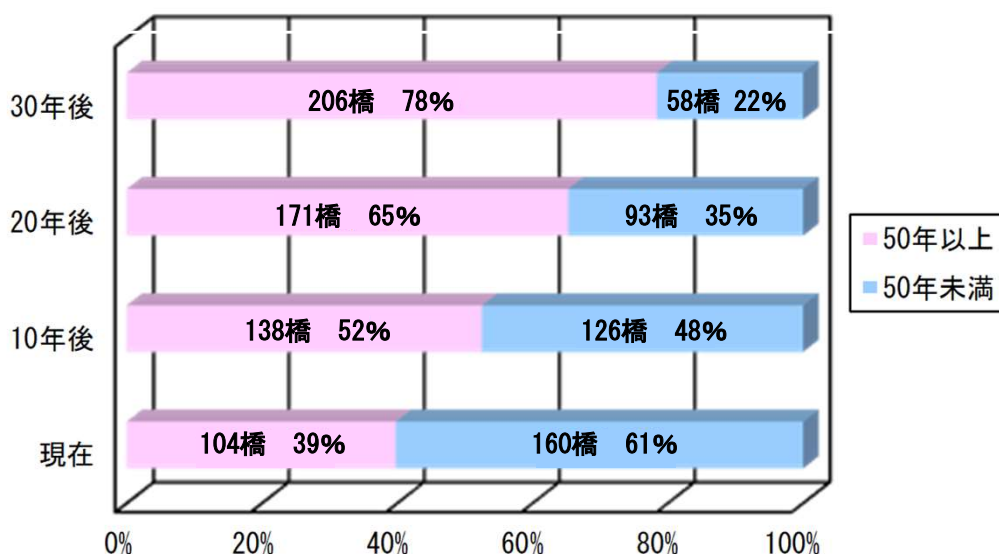

▲供用50年を経過する橋梁の推移

※架設年次不明橋梁は除く

2. 長寿命化修繕計画の目的の設定

(3) 維持管理するうえでの課題

施設の長寿命化

1

今後、老朽化する橋梁が増え、維持管理費用の増加が懸念されるが、土木に対する予算は減少傾向です。よって、限られた予算の中で効率的な維持管理を行うことが課題となります。

近接目視による点検の実施

2

平成26年度より、近接目視点検が義務化されてことにより、点検費用が増加している状況です。また、点検費用が増加に伴い、補修工事は計画通りに実施できていない状況です。

技術職員の高齢化・技術の継承

3


日置市の土木技術職員の平均年齢は、43歳であり、今後10年間で38%の職員が退職となります。今後、適切な維持管理を行う上で、経験の浅い技術者への技術の継承が必要となります。

3. 対象施設について

この計画では、日置市の管理する橋長2.0m以上の道路橋（合計309橋）を計画の対象とします。

	橋長15m以上	橋長15m未満	合計
計画対象橋梁	105	204	309橋

橋種の割合

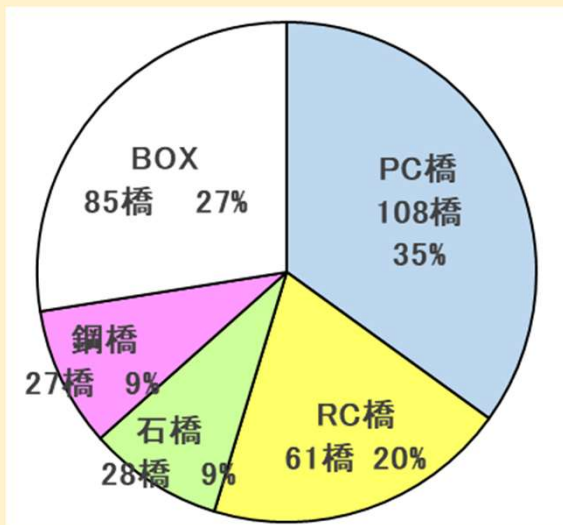

橋種別(全体)で見ると、PC橋(108橋)が約4割、BOX(85橋)が約3割、RC橋(61橋)が約2割、鋼橋(26橋)と石橋(26橋)が共に約1割となっています。

【橋種について】

- ★PC橋 ⇒ 予め応力を加えたPC(プレストレストコンクリート)を使用した橋
- ★RC橋 ⇒ 鉄筋コンクリート橋
- ★鋼橋 ⇒ 鋼材が使用されている橋
- ★石橋 ⇒ 石材で造られた橋
- ★BOX ⇒ 箱形の鉄筋コンクリート函渠（ボックスカルバート）



▲神之川橋（2010年竣工）



▲小川橋（2007年竣工）



▲新川原橋（1970竣工）



▲荻前田橋（1931年竣工）



▲赤崎橋（1995年竣工）

4. 計画期間について

個別計画期間は対象橋梁毎に点検・修繕・架替等の対策内容及び時期を設定し、10年間（2019年～2028年）の個別計画を作成します。

5. 対策の優先順位

長寿命化修繕計画を策定するにあたり、対象橋梁の対策の優先順位を設定し、対策の方針を決定しました。設定は、以下のステップで整理しています。

ステップ1 定期点検結果（健全度の評価）

- ・5年毎に定期点検を実施し、その結果を基に「橋梁の健全度」を把握し、健全性に影響のある橋梁の優先度を高めました。

ステップ2 橋梁の分類

- ・第三者への影響や橋梁の規模といった「社会的影響度」を考慮して、優先順位を設定しました。
- ・石橋や供用期間が長い橋梁（80年以上）等の「特別な維持管理が必要」と考えられる橋梁を考慮して優先順位を設定しました。

ステップ3 条件に基づいた点数付け


- ・進行リスクと橋の規模によって点数付けを行いました。

6. 個別施設の状態

個別施設の状態は5年毎に実施する定期点検によって、健全度（Ⅰ～Ⅳ）を診断することで、状態を把握します。

■ 定期点検結果（H26～H30実施）

判定区分		橋 梁 数
Ⅰ	健全	154橋（61%）
Ⅱ	予防保全	80橋（32%）
Ⅲ	早期措置段階	20橋（8%）
Ⅳ	緊急措置段階	0橋（0%）
合計		254橋

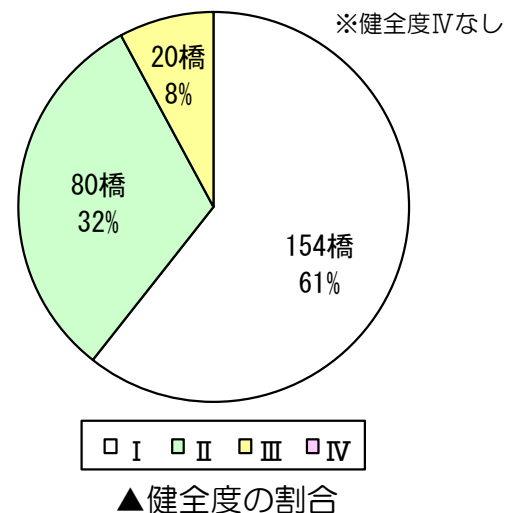


※平成26年度以降の定期点検実施橋梁（計254橋）の結果を集計。

※対象橋梁（309橋）のうち、架替中、撤去予定、未点検の橋梁は除く。

■ 健全度の判定区分（出典：道路橋定期点検要領）

判定区分		判定の内容
Ⅰ	健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態。
Ⅱ	予防保全	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
Ⅲ	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
Ⅳ	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

損傷の例

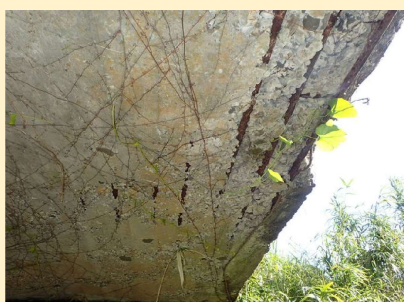

▲RC橋（鉄筋露出）



▲PC橋（ひびわれ、遊離石灰）



▲鋼橋（腐食）

7. 維持管理に対する基本方針

1 戦略的な「予防保全」の実施

- 計画的かつ効率的に点検を行い、早期に損傷を発見、速やかに修繕対策を行います。
- 最新の点検結果、補修・補強履歴の最新の情報をデータベース化し、常に最新情報の更新、閲覧が可能な環境を整備します。

2 日常的な維持管理の取組

- 日常的に巡回（道路パトロール）、路面排水口の清掃を行い、巡回や清掃結果等は記録に残します。

3 橋梁定期点検の実施

- 基準や点検のマニュアルに従い、5年に1回の定期点検を行います。
- 定期点検データは最新の情報に随時更新し、記録・管理を行い、維持管理の基礎資料とします。

4 緊急時における点検の実施

- 地震、台風、集中豪雨等の災害や大きな事故が発生した場合、関係機関と連携し、安全性の確保に努めます。

Q. 予防保全とは・・・

『予防保全』は定期点検に基づき、損傷が軽微な段階で、小規模な補修工事を短いサイクルで行う等、施設が致命的な損傷を受ける前に適切な対策を行います。

※従来は、施設の要求する機能が喪失した時点や喪失する直前に更新（架替え）を行う『事後保全』であり、更新を伴うので多くの費用が必要でした。

8. 対策内容と実施時期

対策の内容と実施の時期は橋種毎（RC橋、PC橋、石橋、BOX）に劣化予測等により決定しました。そして、現在の事業の実施状況等を踏まえて個別で設定しています。

維持管理シナリオイメージ

RC橋、PC橋について

平成30年度までに実施した橋梁定期点検結果を基に、劣化予測により対策時期を決定し、補修対策による維持管理を行います。

鋼橋について

鋼橋の劣化は、鋼材の防食を目的とした塗装の劣化による腐食の進行が考えられます。鋼材の塗装塗替えによって、鋼部材の維持管理を行います。

石橋について

石橋は、補修対策は特殊な技術を要し、工事費が高価となります。そこで、点検による経過観察を行い、健全性を把握した上で、安全性を確保します。また、損傷が確認された場合は、荷重制限等によって可能な限り長寿命化に努めます。

BOX（ボックスカルバート）について


BOX（ボックスカルバート）は、RC橋と同様に、橋梁定期点検結果を基に、劣化予測により対策時期を決定し、補修対策による維持管理を行います。ただし、定期的な補修費と比べて、更新費が安価の場合には、更新による対策を行います。

※維持管理は、補修、更新、荷重制限等の対策と併せて、定期点検（5年毎）に実施します。

9. 対策費用と計画による効果

(1) 対策費用について

今後の50年間の事業費として、従来の『事後保全型』は283.3億円に対して、計画的な『予防保全型』では63.7億円となり、コスト削減効果（-219.6億円：78%減）が見込まれます。

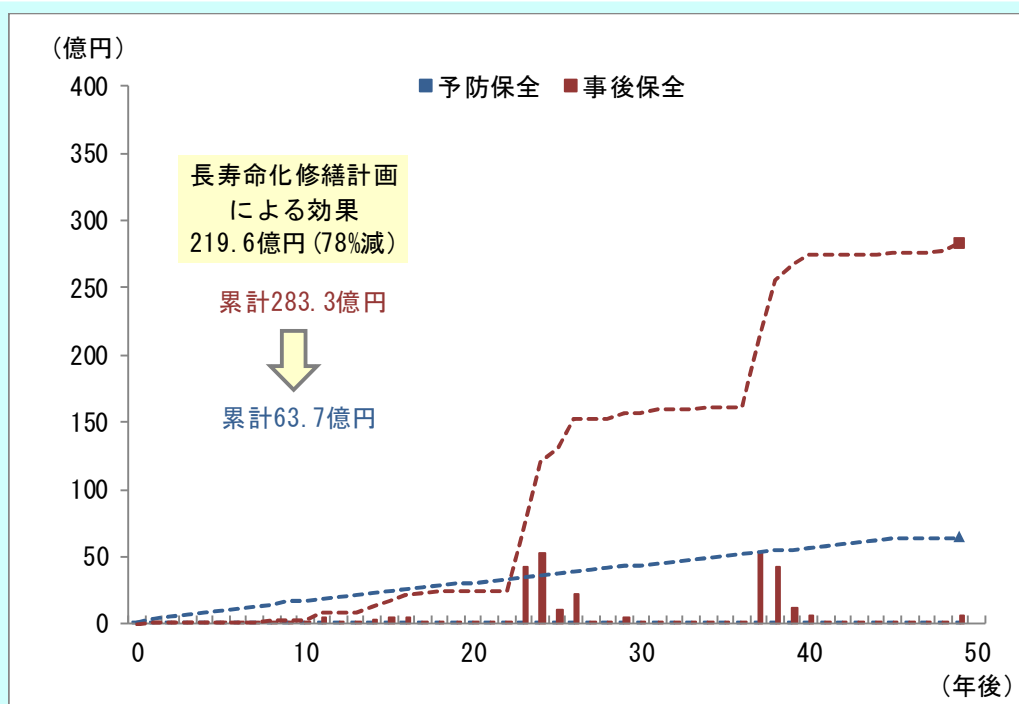

(2) 長寿命化修繕計画による効果

1

橋梁健全度の改善

2

ライフサイクルコストの縮減

3

更新・修繕費用の平準化

10. 学識経験者による意見の聴取

この計画は、学識経験者等の専門知識を有する方の意見を踏まえ策定しました。

【意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者】

鹿児島大学 学術研究院 理工学域工学系 ・武若 耕司 教授
・山口 明伸 教授



▲第1回意見聴取



▲第2回意見聴取



▲第3回意見聴取

【意見聴取日時】

第1回：平成30年12月23日
第2回：平成31年 2月13日
第3回：平成31年 3月13日

11. 集約・撤去、新技術の活用方針について

集約化・撤去

○令和9年度までに、判定Ⅲである橋梁2橋の集約化・撤去を計画しています。

新技術の活用方針

- 定期点検において、作業の効率化や安全性の向上を図るため、「橋梁定期点検技術性能カタログ」などを活用し、新技術の導入を検討します。
- 橋梁補修において、施工性の向上やコスト縮減を図るため、「新技術情報システム（NETIS）」を活用し、設計段階から従来技術との比較を行いながら、新材料や新工法の導入を検討します。
- 今後10年間の橋梁の維持管理費2,049千円のコスト縮減を目指します。

費用の縮減

- 2橋の集約化・撤去により、今後の補修および定期点検において、6,000千円のコスト縮減を目指します。

日置市橋梁長寿命化修繕計画 令和7年5月

＜お問い合わせ先＞

○担当部署 日置市 産業建設部 建設課 土木建設係

〒899-2501 鹿児島県日置市伊集院町下谷口1960番地1

電話番号：099-273-8871

○開庁時間 開庁時間：8時30分～17時15分

（土、日、祝日および12月29日から1月3日を除く）

別紙 「次回点検時期・補修内容・時期及び架替時期」

優先 順位	No.	橋梁名	路線名	所在地	架設 年度 (推定)	橋種	橋長 (m)	有効 幅員 (m)	最新 点検年	判定区分					次回 点検 (年)	次回点検時期・対策内容及び架替時期（費用：千円）【計画期間】2019～2028年（1～10年間）									
																2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
										橋 毎	上 部 工	下 部 工	支 承	そ の 他		対策	対策	対策	対策	対策	対策	対策	対策	対策	対策
1	232	舟倉橋	寺迫	吹上町永吉	1951	BOX	2.0	7.8	2015	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ		I	2020	架替	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	147	鳥越橋	北山元養母	東市来町養母	1975	PC橋	14.7	5.0	2015	Ⅲ	Ⅲ	I	I	Ⅲ	2020	補修	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	5	東川橋	徳重8号	伊集院町徳重	1935	RC橋	30.6	3.4	2015	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	I	Ⅲ	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	83	常堀橋	七呂坊野	吹上町永吉	1964	鋼橋	20.0	3.5	2018	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	I	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	100	渡瀬橋(麓城倉)	麓城倉	吹上町与倉	1964	PC橋	20.0	8.4	2016	Ⅲ	Ⅱ	I	Ⅲ	Ⅱ	2021	補修	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	48	龍雲橋	春城麓上	東市来町長里	1979	鋼橋	25.1	3.0	2015	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	I	2020	補修	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	68	与倉橋	向井与倉	吹上町与倉	1961	PC橋	19.0	3.0	2016	Ⅱ	Ⅱ	I	I	Ⅱ	2021	補修	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	58	諏訪橋(諏訪線)	諏訪	日吉町日置	1973	PC橋	15.7	4.0	2016	Ⅱ	Ⅱ	I	Ⅱ	Ⅱ	2021	補修	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	264	三嶽田橋(今木場)	今木場錫山	吹上町湯之浦	(1968)	鋼橋	7.5	3.0	2016	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	2021	補修	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	141	前田橋(皆田上野)	皆田上野	東市来町湯田	1972	鋼橋	10.4	6.0	2016	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	2021	補修	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	122	清水橋(清水2号)	清水2号	伊集院町上神殿	1973	鋼橋	10.0	3.6	2018	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	2023	補修	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	204	前田橋(湯之元)	湯之元前田	吹上町湯之浦	1966	鋼橋	14.0	3.0	2017	Ⅲ	Ⅲ	I	Ⅲ	Ⅱ	2022	補修	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	235	新川原橋	新川原湯神	吹上町永吉	1970	鋼橋	8.6	3.7	2017	Ⅲ	Ⅲ	I	Ⅲ	Ⅱ	2022	-	補修	-	-	-	-	-	-	-	-
14	103	尾神橋	下土橋尾堂	伊集院町土橋	1956	RC橋	7.4	3.9	2017	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	I	Ⅱ	2022	-	-	-	-	-	-	-	架替	-	-
15	37	皆田橋	長里皆田	東市来町長里	2000	PC橋	25.5	11.7	2016	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	I	I	2021	補修	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	116	諏訪脇橋	麦生田上土橋	伊集院町麦生田	1936	石橋	11.4	3.5	2017	Ⅲ	Ⅲ			Ⅱ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	80	朝原橋	笠岡今田	吹上町	1967	鋼橋	34.1	5.5	2016	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	I	I	2021	-	補修	-	-	-	-	-	-	-	-
18	4	御門前橋側道	徳重郡	伊集院町徳重	1954	鋼橋	40.1	1.5	2016	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	182	唐滝橋	鉾之原住明	東市来町養母	1937	RC橋	11.7	3.8	2017	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	181	前田橋(梅木)	梅木玉田	東市来町養母	1980	鋼橋	12.5	4.0	2017	Ⅲ	Ⅱ	I	Ⅲ	Ⅱ	2022	-	補修	-	-	-	-	-	-	-	-
21	93	川久保橋	川久保	吹上町永吉	1974	鋼橋	54.0	3.0	2015	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	2020	-	補修	-	-	-	-	-	-	-	-
22	266	新永吉橋	永吉花熟里	2008	PC橋	55.5	9.8	2018	I	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	2023	-	補修	-	-	-	-	-	-	-	-
23	172	八枝橋	元養母野田	東市来町養母	1972	PC橋	12.7	4.0	2017	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	2022	-	補修	-	-	-	-	-	-	-	-
24	117	宮下橋	伊集院北小学校	伊集院町下神殿	1976	鋼橋	10.1	3.0	2018	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	2023	-	-	補修	-	-	-	-	-	-	-
25	268	花熟里大橋	永吉花熟里	吹上町花熟里	2010	PC橋	113.0	12.0	2018	I	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	I	2023	-	-	補修	-	-	-	-	-	-	-
26	78	花水流橋	小野花熟里	吹上町花熟里	1967	RC橋	21.7	3.6	2018	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	I	Ⅱ	2023	-	-	補修	-	-	-	-	-	-	-
27	55	轟木橋	堀内・向湯田	東市来町湯田	1988	PC橋	30.4	16.0	2015	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	I	Ⅱ	2020	-	-	-	補修	-	-	-	-	-	-
28	91	砂丘橋	今田湯入来浜	吹上町入来	1981	PC橋	80.0	8.3	2015	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	I	Ⅱ	2020	-	-	-	補修	-	-	-	-	-	-
29	28	報恩寺橋	大田処理場	伊集院町大田	1981	PC橋	41.6	5.0	2015	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	I	Ⅱ	2020	-	-	補修	-	-	-	-	-	-	-
30	25	梅乃前橋	下土橋梅落	伊集院町郡	1966	PC橋	24.2	7.0	2015	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	I	Ⅱ	2020	-	-	-	補修	-	-	-	-	-	-
31	61	若宮橋	日吉町日置	1967	PC橋	22.0	4.5	2015	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	I	Ⅱ	2020	-	-	-	補修	-	-	-	-	-	-	-
32	6	石見堂橋	向江町市来	伊集院町下谷口	1960	RC橋	17.0	5.0	2016	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		Ⅱ	2021	-	-	-	補修	-	-	-	-	-	-
33	180	笹ヶ迫橋	長里美山	東市来町美山	1959	RC橋	8.7	6.6	2017	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	I	Ⅱ	2022	-	-	-	-	補修	-	-	-	-	-
34	238	梨子川第一橋	梨子川	吹上町中之里	1978	BOX	3.6	10.0	2016	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		Ⅱ	2021	-	-	-	-	補修	-	-	-	-	-
35	210	垂外橋	和田小山田	吹上町和田	1964	RC橋	13.8	3.5	2017	I	Ⅱ	Ⅱ	I	Ⅱ	2022	-	-	-	-	補修	-	-	-	-	-
36	135	堅山橋	皆田鉾谷	東市来町湯田	1959	RC橋	5.5	3.6	2017	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		Ⅱ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	220	七ッ山第二橋	七ッ山	吹上町田尻	1957	BOX	5.4	5.0	2017	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		Ⅱ	2022	-	-	-	-	補修	-	-	-	-	-
38	179	穴口橋	柿之迫穴口	東市来町伊作田	2003	BOX	2.8	5.2	2017	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		Ⅱ	2022	-	-	-	-	補修	-	-	-	-	-
39	3	御門前橋	徳重郡	伊集院町徳重	1954	RC橋	39.0	4.5	2016	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		Ⅱ	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	54	みなと橋(港橋)	江口臨港	東市来町伊作田	1987	PC橋	54.4	9.8	2015	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	I	I	2020	-	-	-	-	補修	-	-	-	-	-
41	244	下池幸田第二号橋	入来浜田布施	吹上町入来	1986	BOX	3.9	12.7	2016	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		I	2021	-	-	-	-	補修	-	-	-	-	-
42	223	七ッ山第五橋	七ッ山	吹上町田尻	1957	BOX	4.2	5.0	2017	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		I	2022	-	-	-	-	補修	-	-	-	-	-
43	222	七ッ山第四橋	七ッ山	吹上町田尻	1957	BOX	2.8	3.9	2017	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		I	2022	-	-	-	-	補修	-	-	-	-	-
44	224	七ッ山第六橋	七ッ山	吹上町田尻	1957	BOX	2.7	5.1	2017	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		I	2022	-	-	-	-	補修	-	-	-	-	-
45	81	永吉大橋	麓川久保	吹上町永吉	1969	PC橋	54.0	4.0	2015	Ⅱ	Ⅱ	I	Ⅱ	Ⅱ	2020	-	-	-	-	補修	-	-	-	-	-
46	99	亀原側道橋	中原花熟里	吹上町中原	1985	鋼橋	17.2	2.0	2017	Ⅱ	Ⅱ	I	Ⅱ	Ⅱ	2022	-	-	-	-	-	補修	-	-	-	-
47	90	花見橋	小野馬場花熟里	吹上町小野	1958	RC橋	22.1	4.2	2016	Ⅱ	Ⅱ	I	Ⅱ	Ⅱ	2021	-	-	-	-	補修	-	-	-	-	-
48	84	所常廻橋	七呂坊野	吹上町永吉	2000	PC橋	35.5	10.5	2016	I	Ⅱ	I	Ⅱ	Ⅱ	2021	-	-	-	-	補修	-	-	-	-	-
49	16	東前田橋	下神殿田代	東市来町養母	1983	PC橋	17.9	5.0	2016	Ⅱ	Ⅱ	I	Ⅱ	Ⅱ	2021	-	-	-	-	補修	-	-	-	-	-
50	216	三窪橋	赤仁田三窪	吹上町与倉	1965	鋼橋	12.2	3.5	2017	Ⅱ	Ⅱ		Ⅱ	Ⅱ	2022	-	-	-	補修	-	-	-	-	-	-

別紙「次回点検時期、補修内容・時期及び架替時期」

優先 順位	No.	橋梁名	路線名	所在地	架設 年度 (推定)	橋種	橋長 (m)	有効 幅員 (m)	最新 点検年	判定区分					次回 点検 (年)	次回点検時期、対策内容及び架替時期（費用：千円）【計画期間】2019～2028年（1～10年間）									
										橋 毎	上 部 工	下 部 工	支 承	そ の 他		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
																対策	対策	対策	対策	対策	対策	対策	対策	対策	対策
51	102	安中橋	伊集院吉利	伊集院町古城	1961	RC橋	6.1	4.0	2016	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
52	212	大工園橋	田尻宮田	吹上町田尻	1968	鋼橋	14.4	3.4	2017	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
53	73	岩瀬戸橋	山下永吉	吹上町田尻	1968	鋼橋	23.6	3.6	2015	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
54	207	和気橋	与倉田尻	吹上町田尻	1962	RC橋	13.2	3.6	2017	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55	36	舟橋	長里皆田	東市来町長里	1975	PC橋	29.1	5.0	2016	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
56	110	第1久木野々橋(拡幅部)	大田川口	伊集院町大田	1954	BOX	10.0	5.7	2018	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ		Ⅱ	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
57	57	五丁田橋	床ノ中	日吉町日置	1986	PC橋	20.8	5.0	2015	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
58	101	渡瀬橋側道橋	麓城倉	吹上町与倉	(1989)	PC橋	20.0	2.5	2015	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
59	79	三嶽田橋(三嶽田)	三嶽田	吹上町湯之浦	2000	PC橋	21.3	8.8	2016	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60	45	古城橋	長里江口	東市来町伊作田	1994	PC橋	19.1	4.0	2016	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61	72	新赤仁田橋	赤仁田日添	吹上町与倉	1995	PC橋	19.5	7.0	2015	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
62	219	七ツ山第一橋	七ツ山	吹上町田尻	1957	BOX	3.6	6.4	2015	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ		Ⅱ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63	15	清藤橋(清藤)	徳重清藤	伊集院町清藤	2008	PC橋	22.3	7.0	2016	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64	246	今木場橋	鍋山	吹上町湯之浦	1994	PC橋	13.7	7.6	2017	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	2022	-	-	-	-	-	補修	-	-	-	
65	157	徳重橋	梅木下伊集院	東市来町養母	1974	PC橋	12.5	5.0	2017	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	2022	-	-	-	-	-	-	補修	-	-	
66	231	第二小山田橋	小山田	吹上町永吉	1960	RC橋	5.0	3.9	2017	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ		Ⅱ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
67	193	小吹橋	高月六反田	日吉町吉利	1978	PC橋	11.0	4.0	2017	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	2022	-	-	-	-	-	-	補修	-	-	
68	139	山田橋	湯之元山田	東市来町湯田	1957	RC橋	4.3	4.0	2017	Ⅱ	Ⅱ			Ⅱ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
69	155	内永野橋	内永野下丸尻	東市来町湯田	1952	RC橋	4.0	5.4	2017	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ		Ⅱ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70	236	高付橋	田平高月	吹上町永吉	1991	PC橋	12.2	5.0	2017	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	2022	-	-	-	-	-	-	補修	-	-	
71	128	瀬戸内橋(徳重)	徳重西之原	伊集院町徳重	1978	PC橋	7.9	5.1	2017	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	2022	-	-	-	-	-	-	補修	-	-	
72	127	城之下橋	城之下	伊集院町古城	1978	PC橋	5.0	4.1	2018	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ		Ⅱ	2023	-	-	-	-	-	-	補修	-	-	
73	145	鳩見橋	長里下伊集院	東市来町長里	1976	RC橋	4.1	4.4	2017	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ		Ⅱ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
74	150	四角目橋	获立鉾	東市来町養母	1994	PC橋	6.3	5.0	2017	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	2022	-	-	-	-	-	-	補修	-	-	
75	43	上床橋	元養母上床	東市来町長里	1977	石橋	15.0	4.0	2017	Ⅰ	Ⅱ			Ⅱ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
76	262	立神橋	和田小山田	吹上町和田	1913	石橋	14.3	3.3	2017	Ⅰ	Ⅱ			Ⅱ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
77	173	諏訪橋(中野自在)	中野自在原	東市来町養母	1965	石橋	12.7	4.0	2017	Ⅱ	Ⅱ			Ⅱ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
78	177	井手之段橋	萩鉾之原	東市来町養母	1964	石橋	11.5	4.0	2017	Ⅱ	Ⅱ			Ⅱ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
79	261	赤仁田橋(日添)	赤仁田日添	吹上町与倉	1938	RC橋	11.1	3.6	2017	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80	108	浜吾橋	窪田	伊集院町下谷口	1937	石橋	11.0	4.1	2017	Ⅱ	Ⅱ			Ⅱ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
81	11	吾田橋	窪田	伊集院町下谷口	1978	PC橋	15.9	4.0	2016	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
82	184	永山橋(町生)	町生永山迫	東市来町養母	1927	石橋	9.3	3.6	2017	Ⅱ	Ⅱ			Ⅱ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
83	263	藤元橋	与倉藤之元	吹上町与倉	1937	石橋	9.0	4.7	2017	Ⅰ	Ⅱ			Ⅱ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
84	208	駒田第一橋	駒田荳貴	吹上町与倉	1940	石橋	7.4	3.3	2017	Ⅰ	Ⅱ			Ⅱ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85	197	第二吉利橋	新町向江	日吉町吉利	1943	石橋	4.8	5.5	2017	Ⅰ	Ⅱ			Ⅱ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
86	114	岩川橋	上神殿有屋田	伊集院町上神殿	1934	石橋	4.8	4.3	2017	Ⅱ	Ⅱ			Ⅱ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
87	26	徳重跨線橋	くろがね通り	伊集院町徳重	1985	PC橋	78.1	12.0	2016	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	2021	-	-	-	-	-	-	補修	-	-	
88	32	濱川原橋	文化通り	伊集院町郡	2006	PC橋	35.7	16.0	2016	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	2021	-	-	-	-	-	-	補修	-	-	
89	34	桶脇橋	新町通り	伊集院町徳重	2001	PC橋	34.8	16.0	2016	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	2021	-	-	-	-	-	-	補修	-	-	
90	51	中野橋	上野窓之原	東市来町養母	1980	PC橋	23.4	7.0	2015	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	2020	-	-	-	-	-	-	補修	-	-	
91	44	菅牟田橋	元養母上床	東市来町養母	1993	PC橋	18.2	5.0	2015	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	2020	-	-	-	-	-	-	補修	-	-	
92	65	住吉橋(大西平)	大西平	日吉町日置	1993	鋼橋	17.3	2.5	2015	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	2020	-	-	-	-	-	-	補修	-	-	
93	189	宮田橋(神門)	神門下並松	日吉町吉利	1974	RC橋	3.1	7.2	2017	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ		Ⅰ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
94	190	岩井田橋	岩井田飯牟礼	日吉町吉利	1972	BOX	3.0	6.5	2017	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ		Ⅰ	2022	-	-	-	-	-	-	補修	-	-	
95	126	思案橋拡幅部	向江町	伊集院町徳重	(1956)	PC橋	14.0	1.9	2015	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	2020	-	-	-	-	-	-	補修	-	-	
96	187	諏訪小橋	諏訪	日吉町日置	1973	PC橋	6.4	4.0	2017	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	2022	-	-	-	-	-	-	補修	-	-	
97	137	上立山橋	皆田鉾谷	東市来町湯田	1961	RC橋	4.6	4.3	2017	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ		Ⅰ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
98	202	芋野橋	野首芋野	吹上町田尻	1946	BOX	2.0	3.4	2017	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ		Ⅰ	2022	-	-	-	-	-	-	補修	-	-	
99	118	井手元橋	井出元	伊集院町下神殿	1994	PC橋	14.5	4.0	2018	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	2023	-	-	-	-	-	-	-	補修	-	
100	176	上原橋	上原田之湯	東市来町湯田	1969	RC橋	2.6	4.2	2017	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

別紙「次回点検時期、補修内容・時期及び架替時期」

優先 順位	No.	橋梁名	路線名	所在地	架設 年度 (推定)	橋種	橋長 (m)	有効 幅員 (m)	最新 点検年	判定区分					次回 点検 (年)	次回点検時期、対策内容及び架替時期（費用：千円）【計画期間】2019～2028年（1～10年間）									
										橋 毎	上 部 工	下 部 工	支 承	そ の 他		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
																対策	対策	対策	対策	対策	対策	対策	対策	対策	対策
101	185	雲時小橋	遼矢ヶ原	日吉町日置	1982	BOX	3.0	5.2	2017	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	2022	-	-	-	-	-	-	補修	-	-	-	
102	49	萩前田橋	萩立鉾	東市来町養母	1931	石橋	21.0	5.0	2015	Ⅱ	Ⅱ		Ⅰ	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103	146	大川橋(元養母)	北山元養母	東市来町養母	1961	石橋	12.8	5.2	2017	Ⅱ	Ⅱ		Ⅰ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
104	260	野元橋	長里中伊作田	東市来町伊作田	1928	石橋	12.6	3.1	2017	Ⅰ	Ⅱ		Ⅰ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105	265	無名橋(大田)	大田飯牟礼	伊集院町大田	1943	石橋	3.5	7.8	2016	Ⅰ	Ⅱ		Ⅰ	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
106	226	梅里橋	梅里瀬戸	吹上町永吉	1923	BOX	2.6	10.3	2017	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
107	233	高田橋	高田南	吹上町永吉	1963	RC橋	12.6	3.6	2017	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	2022	-	-	-	-	-	-	補修	-	-	-	
108	250	清藤橋(拡留部)	清藤3号	伊集院町清藤	(1984)	PC橋	7.2	5.1	2016	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	2021	-	-	-	-	-	-	-	補修	-	-	
109	8	古城大橋	伊集院吉利	伊集院町古城	2004	PC橋	111.0	7.5	2016	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	補修	-	
110	22	上高野橋	野田梅木	伊集院町野田	1998	PC橋	24.4	5.0	2016	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	補修	-	
111	239	欽田橋	欽田松原添	吹上町田尻	1959	RC橋	4.0	9.7	2017	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
112	209	駒田第二橋	駒田萱貴	吹上町与倉	1966	RC橋	7.6	4.0	2017	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
113	229	湯神橋	湯神	吹上町永吉	1965	RC橋	5.0	4.2	2017	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
114	191	高月橋	田平印口	日吉町吉利	1992	PC橋	14.0	5.0	2016	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	2021	-	-	-	-	-	-	補修	-	-	-	
115	41	神之川橋	神之川南神之川	東市来町神之川	2010	PC橋	67.4	5.0	2016	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	補修	-	
116	221	七ッ山第三橋	七ッ山	吹上町田尻	1957	BOX	2.7	4.7	2017	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	2022	-	-	-	-	-	-	補修	-	-	-	
117	21	山中橋	山中	伊集院町野田	1979	PC橋	25.6	5.0	2016	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
118	46	大川橋(芝居段)	長里芝居段	東市来町長里	1961	RC橋	17.7	3.6	2016	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	補修	-	
119	82	二俣橋	七呂坊野	吹上町永吉	1999	PC橋	34.0	10.0	2016	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
120	13	下井手橋	麦生田中川	伊集院町麦生田	1994	PC橋	22.2	5.0	2016	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
121	125	九日田橋	下土橋内田	伊集院町土橋	1996	PC橋	10.7	4.0	2017	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
122	249	清藤橋(清藤3号)	清藤3号	伊集院町清藤	1979	RC橋	7.2	5.4	2016	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	2021	-	-	-	-	-	-	-	補修	-	-	
123	52	大田大橋	下方限	伊集院町大田	1990	PC橋	88.0	8.3	2015	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
124	64	大橋(新橋)	新橋熊須	日吉町吉利	1959	PC橋	30.6	6.0	2015	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
125	17	小園橋	市来四郎園	伊集院町下谷口	2009	PC橋	29.4	8.0	2016	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
126	107	竹之山橋	新村中川	伊集院町竹之山	1990	BOX	5.0	7.7	2017	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	補修	-	
127	106	無名橋(土橋)	土橋竹之山	伊集院町土橋	2011	BOX	5.8	11.5	2017	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	補修	-	
128	70	立岩橋	中原入来浜	吹上町入来	1995	PC橋	42.7	10.5	2016	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
129	31	観音堂橋	合庁前	伊集院町徳重	1982	PC橋	33.3	10.0	2016	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
130	18	記念橋	記念通り	伊集院町徳重	2002	PC橋	33.2	12.0	2016	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
131	85	轟橋(湯神)	湯神	吹上町永吉	2004	PC橋	32.0	8.8	2016	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
132	40	鉾前田橋	田代鉾之原	東市来町養母	1994	PC橋	20.0	4.5	2016	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
133	71	春尾橋	瀬谷笠口	吹上町和田	1984	PC橋	15.7	7.0	2015	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
134	10	新吾田橋	窪田	伊集院町下谷口	2002	PC橋	23.0	7.0	2016	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
135	160	赤崎橋	赤崎海岸	東市来町長里	1995	BOX	7.4	11.1	2018	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	2023	-	-	-	-	-	-	-	補修	-	-	
136	87	渡瀬橋(坊野)	坊野野添	吹上町永吉	2007	PC橋	19.6	5.0	2017	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
137	9	新上前田橋	中川土橋	伊集院町土橋	2003	PC橋	15.6	13.3	2017	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
138	112	山王橋	下神殿上神殿	伊集院町上神殿	1990	PC橋	10.6	8.3	2017	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
139	120	諏訪追橋	麦生田上神殿	伊集院町麦生田	2001	PC橋	14.7	7.0	2017	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
140	243	下池牟田第一号橋	入来浜布施	吹上町入来	1986	BOX	2.5	6.0	2017	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	補修	
141	194	山里橋	山里	日吉町吉利	2000	RC橋	7.5	6.0	2017	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	補修	
142	119	宮田橋(麦生田)	麦生田上神殿	伊集院町麦生田	2007	BOX	6.5	7.6	2017	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	補修	
143	144	立和名橋	田代鉾之原	東市来町養母	1994	BOX	4.5	14.4	2017	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	補修	
144	227	小永吉橋	下田尻原園	吹上町永吉	2008	BOX	2.9	7.5	2017	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	補修	
145	217	竜之瀬橋	永野竜之瀬	吹上町湯之浦	1965	RC橋	10.9	3.6	2017	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	補修	
146	214	助代橋	助代梁峯	吹上町和田	1965	RC橋	10.8	3.6	2017	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	補修	
147	113	大橋(桑畑)	桑畑	伊集院町桑畑	1963	RC橋	10.1	4.5	2017	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	補修	
148	213	新山橋	庵之平新山	吹上町田尻	1958	RC橋	6.2	3.8	2017	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	補修	
149	237	第一新川原橋	新川原小山田	吹上町永吉	1966	PC橋	6.1	3.6	2017	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150	183	下鹿丸橋	下鹿丸	東市来町湯田	1955	RC橋	5.8	3.6	2017	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	補修	

別紙「次回点検時期、補修内容・時期及び架替時期」

優先 順位	No.	橋梁名	路線名	所在地	架設 年度 (推定)	橋種	橋長 (m)	有効 幅員 (m)	最新 点検年	判定区分					次回 点検 (年)	次回点検時期、対策内容及び架替時期（費用：千円） 【計画期間】2019～2028年（1～10年間）									
										橋 毎	上 部 工	下 部 工	支 承	そ の 他		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
																対策	対策	対策	対策	対策	対策	対策	対策	対策	対策
151	225	梨子川橋	笠岡今田	吹上町中之里	1967	BOX	5.2	5.7	2017	I	I	I		II	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	補修
152	234	高田第一橋	高田南	吹上町永吉	1972	PC橋	8.5	3.6	2017	I	I	I	I	II	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	215	庭坂橋	瀬谷庭坂	吹上町和田	1968	RC橋	7.4	2.8	2017	I	I	I		II	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	補修
154	178	うちのだ橋	堅山乗越	東市来町湯田	1977	RC橋	6.4	4.1	2017	I	I	I	I	II	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	補修
155	174	大久保橋	田代論田前原	東市来町養母	1972	RC橋	5.4	4.0	2017	I	I	I	I	II	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	補修
156	161	論田橋	田代赤仁田	東市来町養母	1962	RC橋	4.9	4.0	2017	I	I	I		II	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	補修
157	171	郷之平橋	中伊作田郷之平	東市来町伊作田	1953	BOX	4.2	4.3	2017	I	I	I		II	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	補修
158	163	赤仁田橋(田代)	田代赤仁田	東市来町養母	1959	RC橋	4.0	3.8	2017	I	I	I		II	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	補修
159	169	いずみ橋	南神之川日置	東市来町南神之川	1965	RC橋	3.5	3.0	2017	I	I	I	I	II	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	補修
160	168	日寄橋	南神之川日置	東市来町南神之川	1961	RC橋	3.1	3.9	2017	I	I	I		II	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	補修
161	240	前迫橋	小永吉前迫	吹上町永吉	1946	BOX	2.6	2.9	2017	I	I	I		II	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	補修
162	165	牧之角橋	牧之角	東市来町美山	1961	RC橋	2.5	3.5	2017	I	I	I		II	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	補修
163	195	石町橋	大橋狩谷	日吉町日置	1994	PC橋	10.4	5.0	2017	I	I	I	I	II	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	211	垂外橋(拡幅部)	和田小山田	吹上町和田	1996	PC橋	14.1	1.6	2017	I	I	I	I	II	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	104	上前田橋	中川土橋	伊集院町土橋	1979	PC橋	8.6	5.0	2017	I	I	I		II	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	142	谷之口橋	皆田上野	東市来町湯田	1985	RC橋	8.4	5.0	2017	I	I	I		II	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	補修
167	129	瀬戸内橋(瀬戸内)	瀬戸内	伊集院町野田	1980	PC橋	7.9	5.0	2017	I	I	I	I	II	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	251	坂元橋	坂元	伊集院町大田	1978	RC橋	6.3	3.5	2016	I	I	I		II	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	補修
169	130	無名橋(上土橋)	上土橋新村	伊集院町土橋	2000	PC橋	13.6	5.0	2017	I	I	I	I	II	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	192	松ヶ尾橋	西山松ヶ尾	日吉町日置	1990	PC橋	9.0	4.0	2017	I	I	I	I	II	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	218	上与倉橋	大平野黒尾	吹上町与倉	1997	BOX	5.8	5.8	2017	I	I	I		II	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	補修
172	164	赤仁田橋(拡幅部)	田代赤仁田	東市来町養母	1985	BOX	2.9	5.7	2017	I	I	I		II	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	補修
173	166	牧之角橋(拡幅部)	牧之角	東市来町美山	1985	BOX	2.1	1.7	2017	I	I	I		II	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	補修
174	247	第一太平橋	有島中草田	吹上町永吉	2000	PC橋	9.5	5.0	2016	I	I	I	I	II	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	170	いずみ橋(拡幅部)	南神之川日置	東市来町南神之川	2011	鋼橋	3.5	1.4	2017	I	I	I	I	II	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	134	大橋(長里)	長里市来	東市来町長里	1967	石橋	8.7	4.0	2017	I	I			II	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	159	重平橋	田代重平	東市来町養母	2005	BOX	6.9	5.1	2017	I	I	I		II	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	補修
178	162	論田橋(拡幅部)	田代赤仁田	東市来町養母	2005	BOX	3.5	3.7	2017	I	I	I		II	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	補修
179	123	間多羅橋	大田川口	伊集院町大田	2003	BOX	3.3	5.5	2017	I	I	I		II	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	補修
180	241	前迫橋(拡幅部)	小永吉前迫	吹上町永吉	2003	BOX	2.3	1.5	2017	I	I	I		II	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	補修
181	203	芋野橋(拡幅部)	野首芋野	吹上町尻尻	2003	BOX	2.0	1.9	2017	I	I	I		II	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	補修
182	154	橋之口橋	北山田代	東市来町養母	1931	石橋	14.1	4.0	2017	I	I			II	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	257	鉦口橋	中伊作田鉦口	東市来町伊作田	1933	石橋	13.3	3.2	2015	I	I	I		II	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	27	神之川大橋	くろがね通り	伊集院町大田	1986	PC橋	66.7	12.0	2015	I	I	I	I	I	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	96	乙女月橋	乙女月	吹上町与倉	1990	PC橋	55.7	7.0	2015	I	I	I	I	I	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	7	伊集院吉利線跨道橋	伊集院吉利	伊集院町下谷口	2001	PC橋	48.5	9.3	2015	I	I	I	I	I	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	42	坂之上跨道橋	坂之上赤碕	東市来町伊作田	2000	PC橋	47.0	13.5	2015	I	I	I	I	I	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	29	三州橋	つつじヶ丘	伊集院町麦生田	1969	PC橋	30.0	6.5	2015	I	I	I	I	I	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	24	狩集線跨道橋	狩集	伊集院町大田	2001	PC橋	39.5	4.0	2015	I	I	I	I	I	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	196	瀧山橋	植木日新	日吉町神之川	(1968)	RC橋	4.9	5.0	2015	I	I	I	I	I	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	補修
191	39	諏訪原跨道橋	湯之元山田	東市来町湯田	2006	PC橋	34.0	8.8	2015	I	I	I	I	I	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192	19	京之塚跨道橋	京之塚	伊集院町下谷口	2001	PC橋	32.0	4.0	2015	I	I	I	I	I	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	23	西之原橋	狩集	伊集院町大田	1988	PC橋	26.0	4.0	2015	I	I	I	I	I	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	12	船中橋	下神殿上神殿	伊集院町下神殿	2000	PC橋	25.0	9.0	2016	I	I	I	I	I	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	148	小川橋(江口)	江口海岸	東市来町伊作田	1997	RC橋	11.4	4.0	2015	I	I	I	I	I	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	補修
196	255	下山橋	下養母皆田	東市来町長里	2017	PC橋	28.5	5.0	2018	I	I	I	I	I	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	53	鶴丸橋	長里団地5号	東市来町長里	1977	PC橋	29.0	8.0	2015	I	I	I	I	I	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198	60	川宮橋	川口美山	日吉町日置	1988	PC橋	30.8	5.0	2015	I	I	I	I	I	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	47	岩平橋	長里芝居段	東市来町長里	1971	PC橋	22.0	4.0	2015	I	I	I	I	I	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	30	三州橋側道橋	つつじヶ丘	伊集院町麦生田	1998	PC橋	34.2	3.0	2015	I	I	I	I	I	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

別紙「次回点検時期、補修内容・時期及び架替時期」

優先 順位	No.	橋梁名	路線名	所在地	架設 年度 (推定)	橋種	橋長 (m)	有効 幅員 (m)	最新 点検年	判定区分					次回 点検 (年)	次回点検時期、対策内容及び架替時期（費用：千円）【計画期間】2019～2028年（1～10年間）									
										橋 毎	上 部 工	下 部 工	支 承	そ の 他		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
																対策	対策	対策	対策	対策	対策	対策	対策	対策	対策
251	66	八幡橋	八幡新橋	日吉町日置	1956	RC橋	20.0	4.7	2016	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ			2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
252	76	大橋(仕明)	仕明	吹上町湯浦地内	1961	RC橋	16.2	3.5	2015	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ		Ⅱ	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
253	167	諏訪殿橋	神之川臨港	東市来町南神之川	2017	BOX	3.0	5.6	2016	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ		Ⅱ	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
254	2	清水橋(元町)	元町	伊集院町下谷口	1966	PC橋	26.4	2.5	2015	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
255	136	中堅山橋	皆田鉾谷	東市来町湯田	1977	鋼橋	8.4	4.0	2017	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
256	94	岩瀧橋	神田岩瀧	吹上町中原	1958	RC橋	23.6	4.2	2015	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
257	270	伊集院駅自由通路橋	連絡通路	伊集院町徳重	2016	鋼橋	68.8	3.5	(2020)						2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
258	62	大川橋(帆ノ港)	上の浜帆ノ港	日吉町吉利	1984	PC橋	27.5	2.6	2015	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
259	35	平田橋(湯之元)	湯之元向湯田	東市来町湯田	2018	PC橋	39.0	13.8	(2020)						2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
260	260	無名橋(伊中飯牟礼)	伊中飯牟礼	伊集院町飯牟礼	-	RC橋	5.5	3.4	2022	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
261	261	無名橋(飯牟礼腰)	飯牟礼腰	伊集院町飯牟礼	-	BOX	4.1	8	2022	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
262	262	無名橋(中川西俣)	中川西俣	伊集院町中川	-	RC橋	2.4	9.2	2022	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅰ	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
263	263	無名橋(上前田)	上前田	伊集院町土橋	-	BOX	2.4	6.5	2022	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
264	264	無名橋1(中川)	中川	伊集院町中川	-	BOX	2.2	8.3	2022	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
265	265	無名橋2(中川)	中川	伊集院町中川	-	BOX	4.4	8.9	2022	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
266	266	無名橋(大田川口)	大田川口	伊集院町大田	-	BOX	2.4	5.5	2022	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
267	267	無名橋(くろがね通り)	くろがね通り	伊集院町妙円寺	-	BOX	9	22.5	2022	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅰ	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
268	268	無名橋(牧之角)	牧之角	東市来町寺脇	-	BOX	2.2	4.9	2022	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
269	269	無名橋(中伊作田山ノ下頭)	中伊作田山ノ下頭	東市来町伊作田	-	BOX	2.4	6	2022	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
270	270	無名橋(柿之迫穴口)	柿之迫穴口	東市来町伊作田	-	BOX	2.2	7	2022	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅱ	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
271	271	無名橋(長里市来)	長里市来	東市来町長里	-	BOX	2.6	19.8	2022	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
272	272	無名橋1(長里川北)	長里川北	東市来町長里	-	BOX	2.2	5	2022	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
273	273	無名橋2(長里川北)	長里川北	東市来町長里	-	BOX	2.4	6.4	2022	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅱ	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
274	274	無名橋3(長里川北)	長里川北	東市来町長里	-	BOX	2.4	6.4	2022	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅰ	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
275	275	無名橋(元伊作田小田峰)	元伊作田小田峰	東市来町伊作田	-	RC橋	5.9	3.8	2022	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅰ	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
276	276	佛谷橋	湯之元上野	東市来町湯田	2003	PC橋	8.3	9	2022	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅱ	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
277	277	無名橋(皆田上野)	皆田上野	東市来町湯田	-	BOX	2.1	5.7	2022	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
278	278	小平橋	上床鍋ヶ原	東市来町湯田	2001	PC橋	10.6	6.2	2022	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
279	279	無名橋(湯之元浦田)	湯之元浦田	東市来町湯田	-	BOX	2.6	8.4	2022	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅱ	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
280	280	無名橋(山神子立元原)	山神子立元原	東市来町伊作田	-	BOX	3.5	6.3	2022	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
281	281	無名橋(萩東皆野)	萩東皆野	東市来町養母	-	石橋	2.9	3	2022	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅱ	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
282	282	無名橋(湯之元山田)	湯之元山田	東市来町湯田	-	BOX	2.5	4.9	2022	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
283	283	無名橋1(笠ヶ野)	笠ヶ野	日吉町日置	-	BOX	2.6	10.1	2022	Ⅱ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
284	284	無名橋2(笠ヶ野)	笠ヶ野	日吉町日置	-	BOX	2.3	8.6	2022	Ⅰ	Ⅰ	-	-	Ⅰ	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
285	285	無名橋(北原)	北原	日吉町日置	-	BOX	2.7	7.3	2022	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	-	Ⅰ	2027	-	-	-	-	補修	-	-	-	-	
286	286	無名橋(潟山)	潟山	日吉町神之川	-	BOX	2.4	6.45	2022	Ⅰ	Ⅰ	-	-	Ⅱ	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
287	287	無名橋(迫田)	迫田	日吉町日置	-	BOX	2.7	7.1	2022	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
288	288	無名橋(中木場野井田)	中木場野井田	日吉町日置	-	石橋	4.6	5	2022	Ⅱ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
289	289	無名橋(新久)	新久	日吉町日置	-	BOX	3	5.1	2022	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
290	290	無名橋(萩原伊神)	萩原伊神	日吉町吉利	-	BOX	2.7	6.6	2022	Ⅰ	Ⅰ	-	-	Ⅱ	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
291	291	無名橋1(新橋熊須)	新橋熊須	日吉町吉利	-	BOX	2.5	11	2022	Ⅰ	Ⅰ	-	-	Ⅱ	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
292	292	無名橋2(新橋熊須)	新橋熊須	日吉町吉利	-	BOX	4.4	7.7	2022	Ⅰ	Ⅰ	-	-	Ⅱ	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
293	293	無名橋(樗木草見)	樗木草見	日吉町日置	-	BOX	2.3	9.5	2022	Ⅰ	Ⅰ	-	-	Ⅱ	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
294	294	無名橋(遠矢ヶ原)	遠矢ヶ原	日吉町日置	-	BOX	4.4	15.1	2022	Ⅰ	Ⅰ	-	-	Ⅱ	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
295	295	第一太田橋	大平	吹上町永吉	1978	PC橋	13.8	3.6	2022	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
296	296	日當平橋	日當平	吹上町永吉	1969	鋼橋	13.3	3.6	2022	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	2027	-	-	-	-	補修	-	-	-	-	
297	297	無名橋(山手)	山手	吹上町永吉	-	RC橋	4.9	5.5	2022	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
298	298	無名橋(中之里塩水流)	中之里塩水流	吹上町湯之浦	-	BOX	2.5	11.8	2022	Ⅰ	Ⅰ	-	-	Ⅰ	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
299	299	無名橋(多宝寺野首)	多宝寺野首	吹上町中原	-	BOX	2.8	8.5	2022	Ⅱ	Ⅰ	-	-	Ⅱ	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
300	300	無名橋(小野小永吉)	小野小永吉	吹上町永吉	-	RC橋	3	4.2	2022	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

別紙「次回点検時期、補修内容・時期及び架替時期」

[illegible]
